
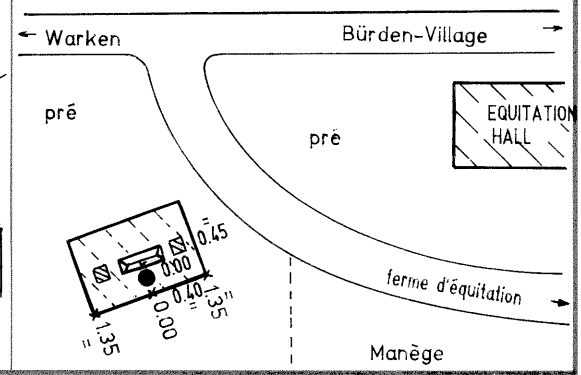

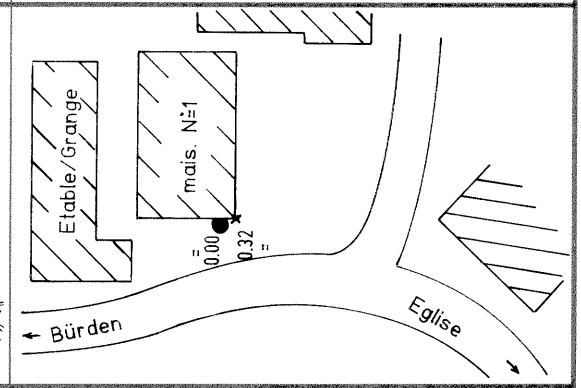

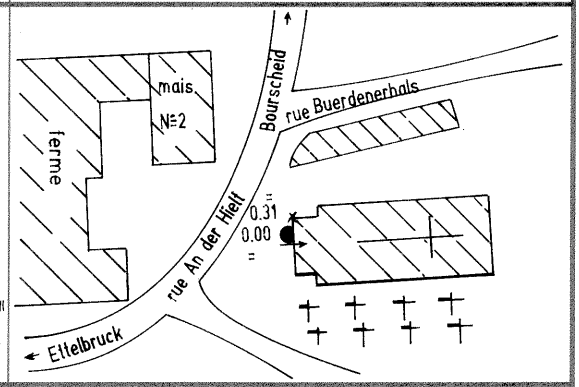

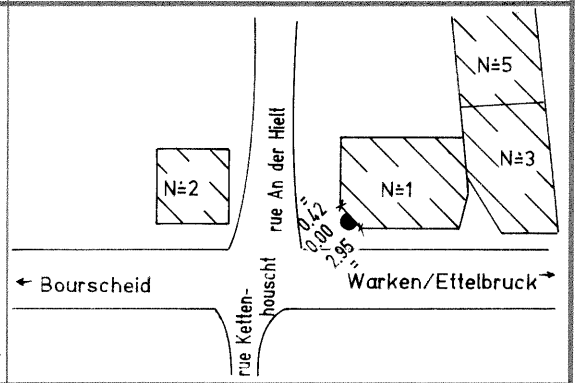

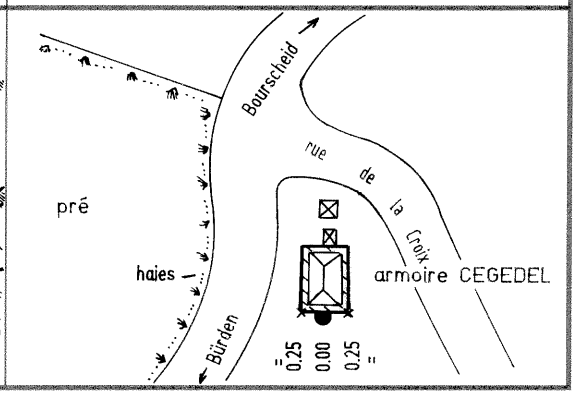
Nº du Point / Route, etc. / Kilométrage / Nature du Rep.	Nom et Situation du Point de Nivellement	Côte au-dessus du N. N. Provisoire	Définitive	CROQUIS dressés en 1993 — Élévation	Croquis planimétrique	663
6	Burden Ferme Chelius Socle transformateur CEGEDEL					
rivet laiton			332,913			
7 CR348a	Burden maison N=1					
r.N.G.			350,199			
8 CR348a	Burden Eglise rue An der Hielt					
r.N.G.			354,877			
9 CR348	Burden maison N=1 An der Hielt					
r.N.G.			385,887			
10 CR348	Burden Armoire CEGEDEL					
r.N.G.			395,293			

A 12 6088 91 A
