
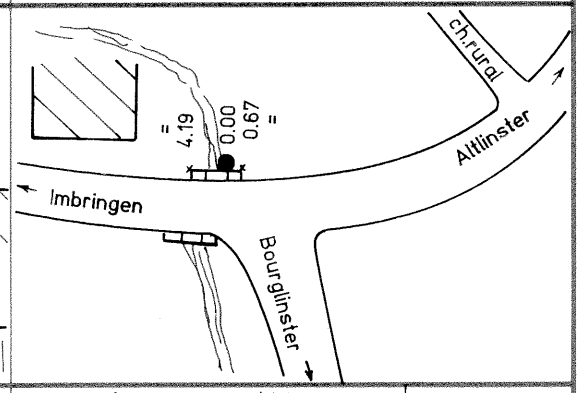

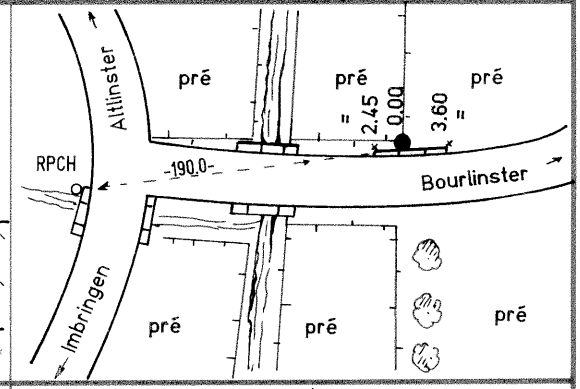

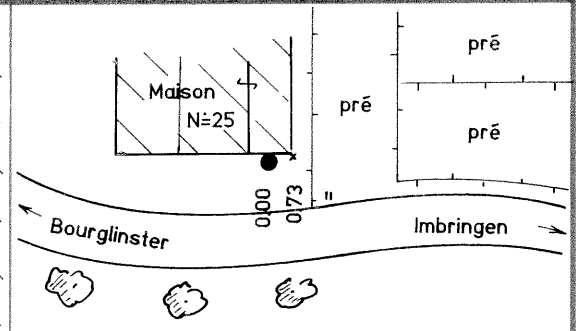

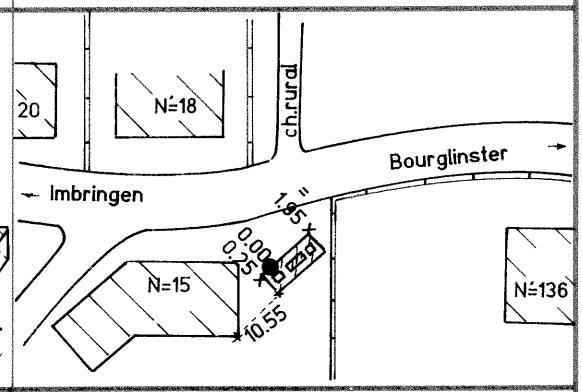
N° du Point / Route, etc. / Kilométrage / Nature du Rep.	Nom et Situation du Point de Nivellement	Côte au-dessus du N. N. Provisoire	Définitive	CROQUIS dressés en 1995 — Élévation	Croquis planimétrique	851
1 N30 R.P.CH.	Imbringen pont sur ruisseau		305,947			
2 CR122 r.N.G.	Imbringen mur de soutènement chemin de Imbringen vers Bourglinster		306,473			
3 CR122 r.N.G.	Bourglinster Maison isolée rue d'Imbringen, no 25		329,108			
4 CR122 r.laiton	Bourglinster socle trafo Cegedel rue d'Imbringen, no 15		337,782			
5 CR122 r.N.G.	Bourglinster Ecole rue de Imbringen		333,807	
