
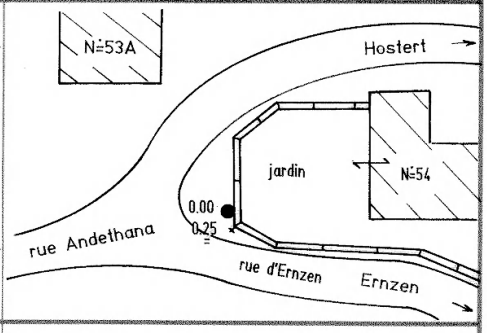

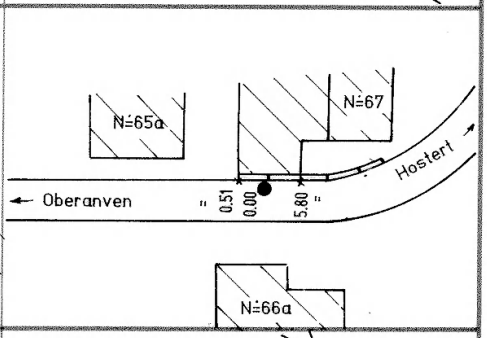

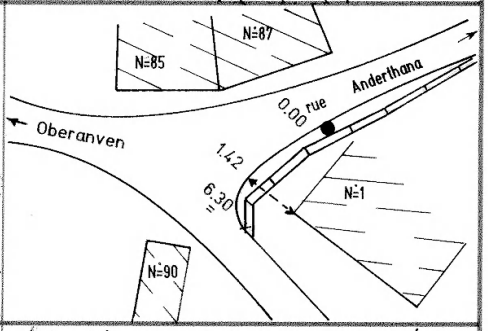

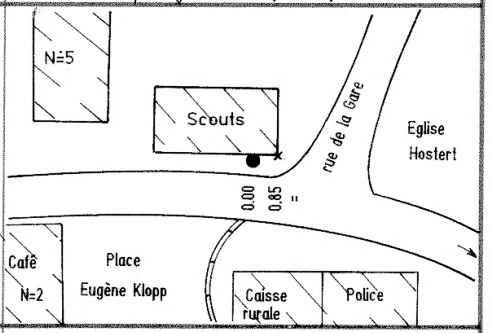

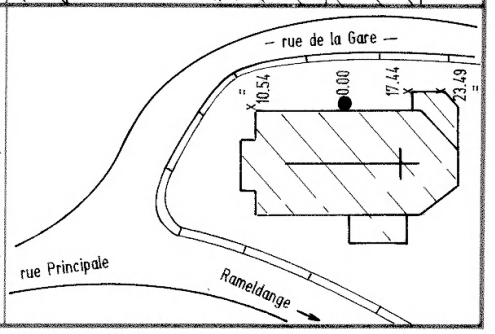
**ADMINISTRATION du CADASTRE** - NIVELLEMENT GENERAL du Gr.-D. de LUXEMBOURG 1995

| N° du Point / Route, etc. / Kilométrage / Nature du Rep. | Nom et Situation du Point de Nivellement | Côte au-dessus du N. N. Provisoire | Définitive | CROQUIS dressés en 1995 — Élévation | Croquis planimétrique | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **24.1** CR127 r.N.G. | Oberanven<br>mur d'enceinte de la<br>maison N=54<br>rue Andethana | | 276,647 |  |  | |
| **24.2** CR127 r.N.G. | Oberanven<br>mur de soutènement de<br>la maison N=67<br>rue Andethana | | 290,607 |  |  | |
| **24.3** CR127 r.N.G. | Hostert<br>mur de soutènement de<br>la maison N=1<br>Coin rue Principale et<br>rue Andethana | | 316,931 |  |  | |
| **24.4** r.N.G. | Hostert<br>maison des Scouts<br>coin ruePrincipale et rue<br>de la Gare | | 328,908 |  |  | |
| **25** R.N.G. | Hostert<br>Eglise<br>coin rue de la Gare et rue Principale | | 336,579 |  |  | |

18 140
